"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор ООО "НОРДСТРОЙ"
_____ Б.В. Лукичев

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по объекту строительства "Жилой комплекс из 3-х домов, расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, участок 432"

Приложение №2 к договору №СМР-Шушары-1/2015 от 23.01.2015г.
"УТВЕРЖДАЮ" и.о. генерального директора
на основании доверенности №б/н ЗАО "Фирма"Петротрест-Монолит"
_____ С.М. Кондрашов
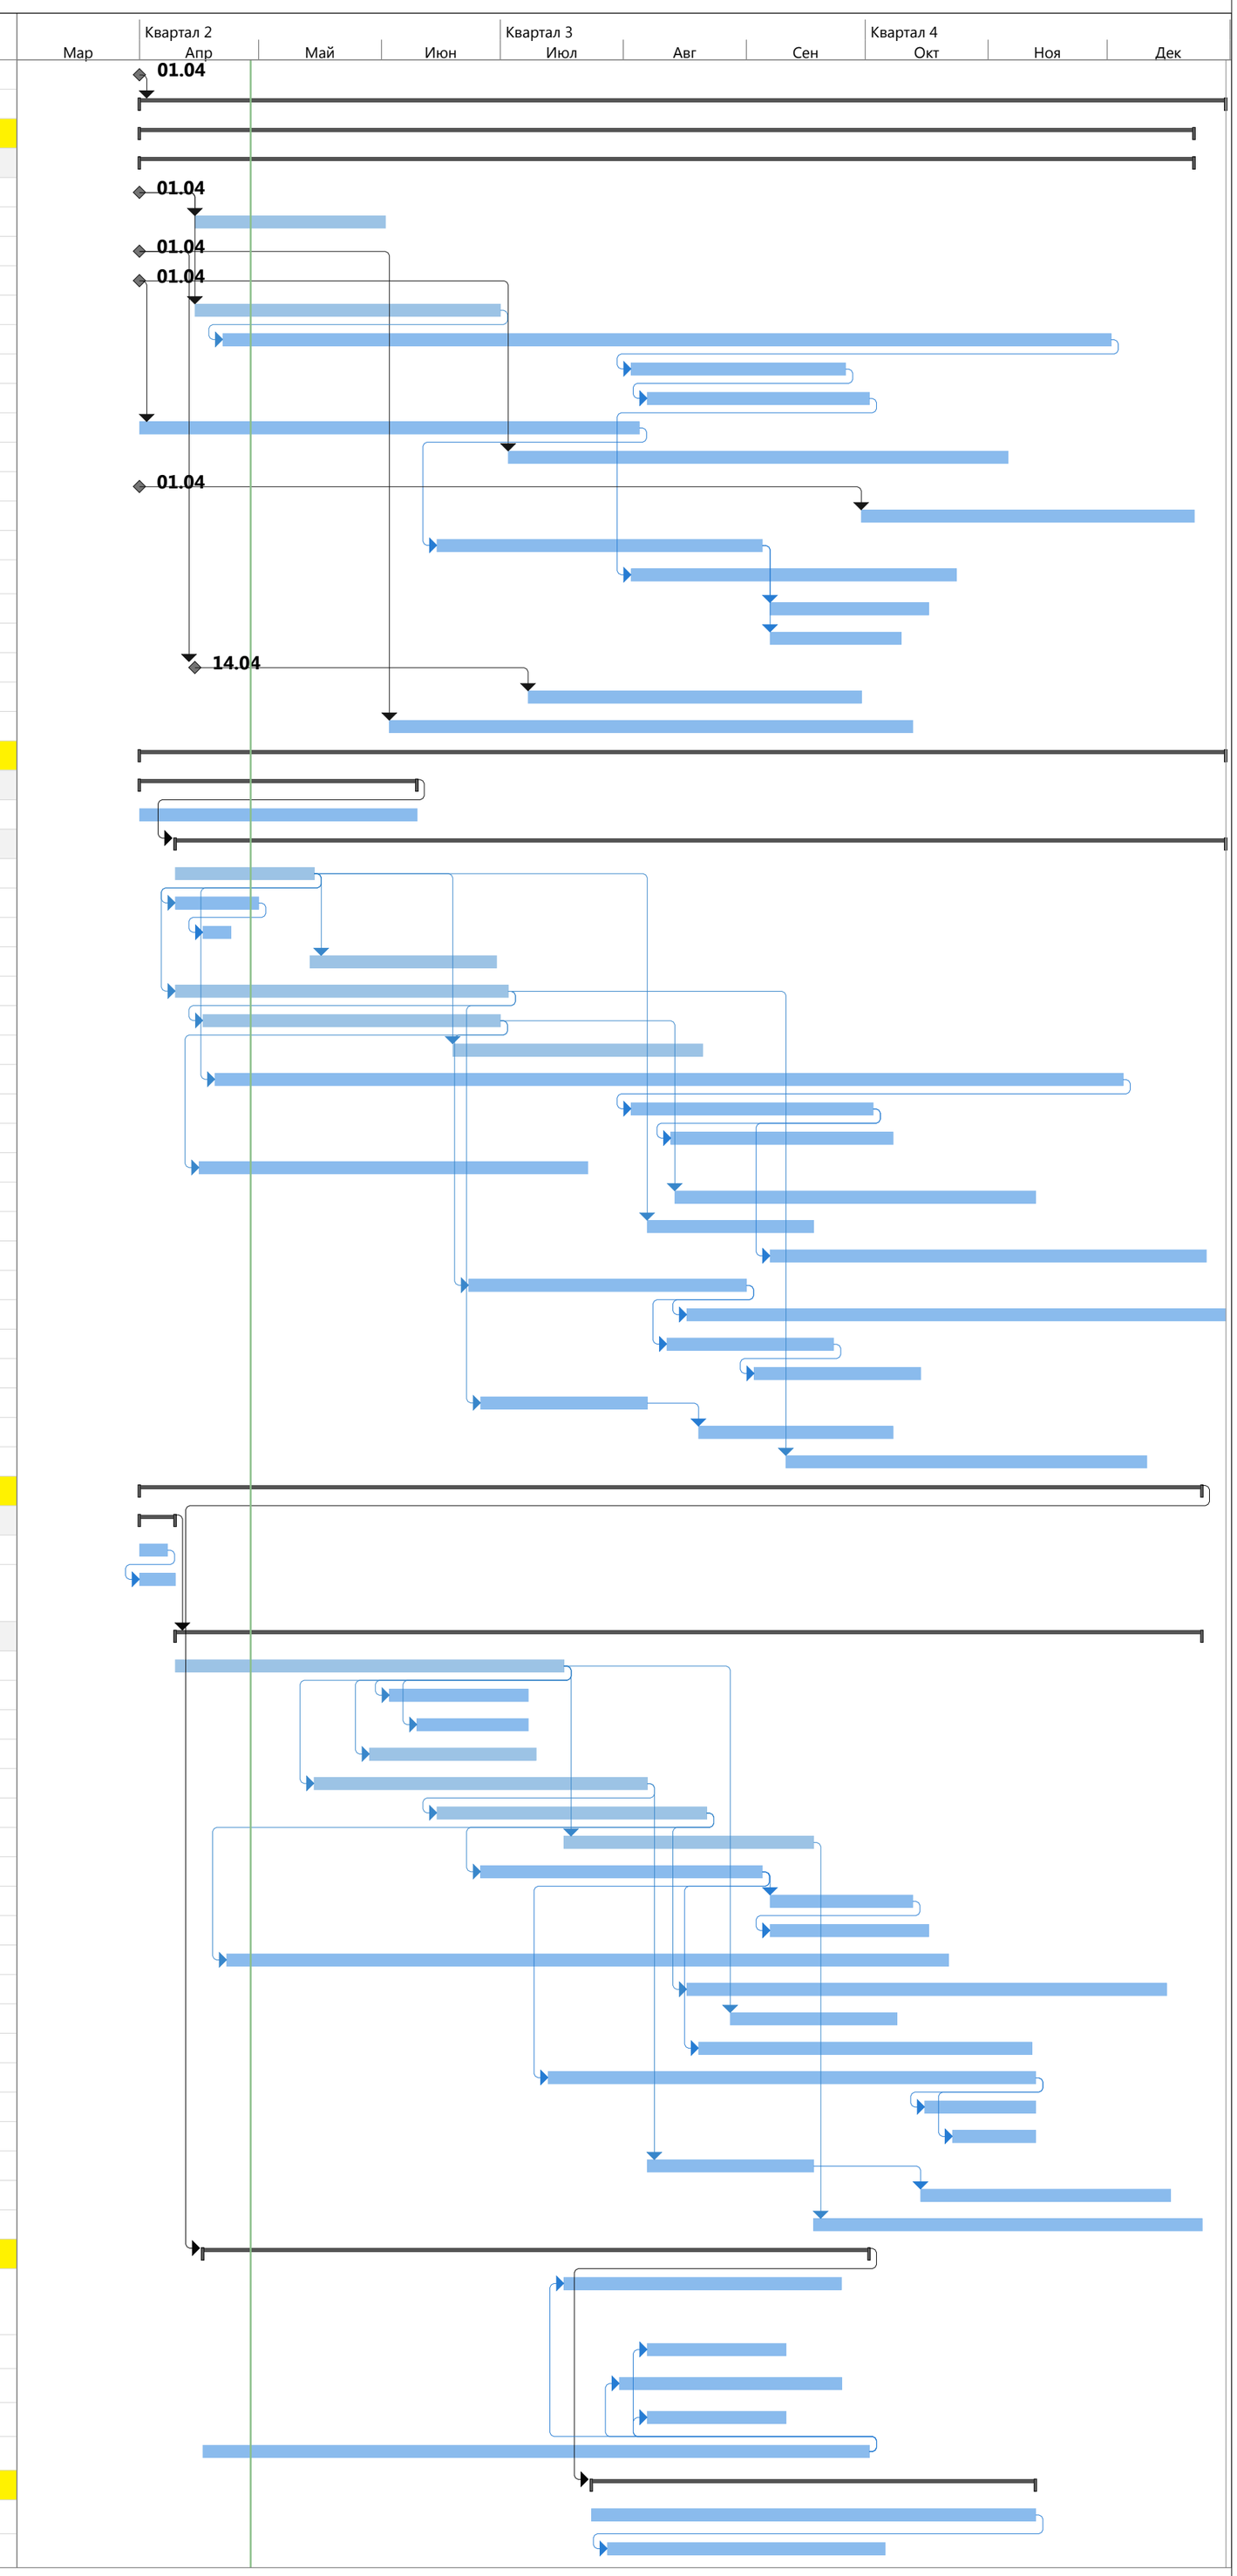
Ид.	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Начало	Окончание
1	проект		0	Ср 01.04.15	Ср 01.04.15
2	Трио, пос.Шушары		1	Ср 01.04.15	Ср 30.12.15
3	СМР: 1 корпус, 3051,9м2		1	Ср 01.04.15	Вт 22.12.15
4	Надземная часть		1	Ср 01.04.15	Вт 22.12.15
5	дренаж		0	Ср 01.04.15	Ср 01.04.15
6	Металлоконструкции	тн	7	Ср 15.04.15	Пн 01.06.15
7	Кладка наружных стен	м3	0	Ср 01.04.15	Ср 01.04.15
8	Ус-во внутр. Стен и перегородок	м2	0	Ср 01.04.15	Ср 01.04.15
9	Кровля	м2	1180	Ср 15.04.15	Вт 30.06.15
10	Внутренние сети ОВ и ВК	м2	3052	Ср 22.04.15	Вт 01.12.15
11	Газоснабжение	комплекс	1	Пн 03.08.15	Пт 25.09.15
12	газовые котлы с бойлерами	шт.	52	Пт 07.08.15	Чт 01.10.15
13	Электрика	м2	3052	Ср 01.04.15	Вт 04.08.15
14	Слаботочка	м2	3052	Пт 03.07.15	Чт 05.11.15
15	Монтаж лифтов	шт.	0	Ср 01.04.15	Ср 01.04.15
16	ПНР	компл.	1	Ср 30.09.15	Вт 22.12.15
17	Черновая отделка	м2	3052	Пн 15.06.15	Пт 04.09.15
18	Чистовая отделка	м2	3052	Пн 03.08.15	Пт 23.10.15
19	Двери квартирные	шт.	52	Пн 07.09.15	Пт 16.10.15
20	Двери металлические противопожарные	м2	30	Пн 07.09.15	Пт 09.10.15
21	Окна	м2	0	Вт 14.04.15	Вт 14.04.15
22	Витражи	м2	468	Ср 08.07.15	Вт 29.09.15
23	Фасад	м2	2483	Ср 03.06.15	Пн 12.10.15
24	СМР: 2 корпус, 3070,3м2		1	Ср 01.04.15	Ср 30.12.15
25	0 цикл		1	Ср 01.04.15	Вт 09.06.15
26	Устройство дренажа	Пм	30	Ср 01.04.15	Вт 09.06.15
27	Надземная часть		1	Пт 10.04.15	Ср 30.12.15
28	Монолитные стены и перекрытия	м3	65	Пт 10.04.15	Чт 14.05.15
29	Вентблоки	шт.	16	Пт 10.04.15	Чт 30.04.15
30	Лестницы	шт.	6	Пт 17.04.15	Чт 23.04.15
31	Металлоконструкции	тн	7	Чт 14.05.15	Пн 29.06.15
32	Кладка наружных стен	м3	433	Пт 10.04.15	Чт 02.07.15
33	Ус-во внутр. Стен и перегородок	м2	1986	Пт 17.04.15	Вт 30.06.15
34	Кровля	м2	1180	Пт 19.06.15	Чт 20.08.15
35	Внутренние сети ОВ и ВК	м2	3070	Пн 20.04.15	Пт 04.12.15
36	Газоснабжение	комплекс	1	Пн 03.08.15	Пт 02.10.15
37	газовые котлы с бойлерами	шт.	52	Чт 13.08.15	Ср 07.10.15
38	Электрика	м2	3070	Чт 16.04.15	Ср 22.07.15
39	Слаботочка	м2	3070	Пт 14.08.15	Чт 12.11.15
40	Монтаж лифтов	шт.	3	Пт 07.08.15	Чт 17.09.15
41	ПНР	компл.	1	Пн 07.09.15	Пт 25.12.15
42	Черновая отделка	м2	3070	Вт 23.06.15	Пн 31.08.15
43	Чистовая отделка	м2	3070	Пн 17.08.15	Ср 30.12.15
44	Двери квартирные	шт.	52	Ср 12.08.15	Вт 22.09.15
45	Двери металлические противопожарные	м2	30	Чт 03.09.15	Ср 14.10.15
46	Окна	м2	502	Пт 26.06.15	Чт 06.08.15
47	Витражи	м2	468	Чт 20.08.15	Ср 07.10.15
48	Фасад	м2	2483	Пт 11.09.15	Чт 10.12.15
49	СМР: 3 корпус, 3263,9м2		1	Ср 01.04.15	Чт 24.12.15
50	0 цикл		1	Ср 01.04.15	Чт 09.04.15
51	Устройство дренажа		0	Ср 01.04.15	Вт 07.04.15
52	Устройство подкрановых путей, монтаж/запуск крана		1	Ср 01.04.15	Чт 09.04.15
53	Надземная часть		1	Пт 10.04.15	Чт 24.12.15
54	Монолитные стены и перекрытия	м3	1989	Пт 10.04.15	Чт 16.07.15
55	Вентблоки	шт.	76	Ср 03.06.15	Вт 07.07.15
56	Лестницы	шт.	24	Ср 10.06.15	Вт 07.07.15
57	Металлоконструкции	тн	9	Пт 29.05.15	Чт 09.07.15
58	Кладка наружных стен	м3	480	Пт 15.05.15	Чт 06.08.15
59	Ус-во внутр. Стен и перегородок	м2	2548	Пн 15.06.15	Пт 21.08.15
60	Кровля	м2	1169	Пт 17.07.15	Чт 17.09.15
61	Внутренние сети ОВ и ВК	м2	3264	Пт 26.06.15	Пт 04.09.15
62	Газоснабжение	комплекс	1	Пн 07.09.15	Пн 12.10.15
63	газовые котлы с бойлерами	шт.	52	Пн 07.09.15	Пт 16.10.15
64	Электрика	м2	3070	Чт 23.04.15	Ср 21.10.15
65	Слаботочка	м2	3070	Пн 17.08.15	Вт 15.12.15
66	Монтаж лифтов	шт.	3	Пт 28.08.15	Чт 08.10.15
67	ПНР	компл.	1	Чт 20.08.15	Ср 11.11.15
68	Внутренняя отделка, 3 корпус	м2	3264	Пн 13.07.15	Чт 12.11.15
69	Двери квартирные	шт.	56	Пт 16.10.15	Чт 12.11.15
70	Двери металлические противопожарные	м2	35	Пт 23.10.15	Чт 12.11.15
71	Окна	м2	552	Пт 07.08.15	Чт 17.09.15
72	Витражи	м2	516	Чт 15.10.15	Ср 16.12.15
73	Фасад	м2	2225	Пт 18.09.15	Чт 24.12.15
74	Наружные сети		1	Пт 17.04.15	Чт 01.10.15
75	Канализация d100-150мм,d250мм.; Водопровод d110мм, d65мм, в т.ч. дренаж	м/п	721	Пт 17.07.15	Чт 24.09.15
76	Кабельная линия 0,4 кВ	м/п	810	Пт 07.08.15	Чт 10.09.15
77	Внутриплощадочные сети освещения	комплекс	1	Пт 31.07.15	Чт 24.09.15
78	Монтаж тех.канализации связи	комплекс	1	Пт 07.08.15	Чт 10.09.15
79	Газоснабжение	м/п	230	Пт 17.04.15	Чт 01.10.15
80	Благоустройство и озеленение		1	Пт 24.07.15	Чт 12.11.15
81	Покрытие проездов и тротуаров	м2	7230	Пт 24.07.15	Чт 12.11.15
82	Озеленение	м2	4980	Вт 28.07.15	Пн 05.10.15
